



# Matriz de Riesgos de Comunicación

Proyecto Aula Señora

# Criterios de Clasificación

## Probabilidad (descending scale)

### Alta

Ocurre frecuentemente ( $> 70\%$  de los casos)

### Media

Ocurre ocasionalmente ( $30\% - 70\%$ )

### Baja

Ocurre raramente ( $< 30\%$ )

## Impacto (ascending scale)

### Crítico

Amenaza la finalización del proyecto o causa daño irreversible

### Alto

Afecta significativamente el cronograma, calidad o relaciones con stakeholders clave

### Medio

Impacto moderado, manejable con recursos adicionales

### Bajo

Impacto menor, no afecta los objetivos del proyecto



# Inventario de Riesgos de Comunicación (R1 – R6)

## R1

### Daily standups no ocurren

**Descripción:** El equipo pierde la alineación diaria, cada miembro trabaja en prioridades distintas y se duplican esfuerzos.

**Causa Raíz:** Falta de disciplina en la ceremonia Scrum; equipo pequeño asume que "ya saben lo que hay que hacer".

## R2

### Feedback del evaluador no documentado

**Descripción:** Los comentarios del profesor/evaluador en sprint reviews se pierden porque no se registran en Jira ni en actas.

**Causa Raíz:** No hay un rol asignado para tomar minutas; se confía en la memoria.

## R3

### Jira desactualizado

**Descripción:** Las tareas avanzan pero no se reflejan en el tablero Jira, perdiendo la trazabilidad del progreso real.

**Causa Raíz:** Prioridad al código sobre la administración del tablero; tareas sin mover de columna.

## R4

### Sin notificaciones a usuarios sobre cambios

**Descripción:** Nuevas funcionalidades se lanzan sin avisar a estudiantes y voluntarios, resultando en baja adopción.

**Causa Raíz:** Falta de un proceso de release communication integrado al flujo de desarrollo.

## R5

### Decisiones en canales informales sin registro

**Descripción:** Discusiones importantes vía WhatsApp/Discord no quedan documentadas, se pierden acuerdos y decisiones técnicas.

**Causa Raíz:** Cultura de mensajería instantánea sin disciplina de volcado a Jira.

## R6

### Reportes semanales no se envían al evaluador

**Descripción:** El profesor/evaluador no recibe actualizaciones periódicas del progreso, generando incertidumbre sobre el avance real.

**Causa Raíz:** No hay un recordatorio automatizado ni responsable fijo para la elaboración del reporte.



# Inventario de Riesgos de Comunicación (R7 – R12)

## R7

### Documentación técnica desactualizada

**Descripción:** El código cambia pero la documentación no se actualiza, dificultando el mantenimiento futuro.

**Causa Raíz:** La documentación se ve como actividad final, no como parte del desarrollo.

## R8

### Sprint goals ambiguos

**Descripción:** Los objetivos del sprint no se comunican con claridad, cada miembro interpreta las prioridades de forma diferente.

**Causa Raíz:** Planning insuficiente; historias de usuario sin criterios de aceptación claros.

## R9

### Silencio en bloqueadores

**Descripción:** Un miembro encuentra un bloqueador pero no lo comunica, el issue escala sin que nadie más lo sepa.

**Causa Raíz:** Miedo a reportar retrasos; cultura de "lo resuelvo solo".

## R10

### Sin comunicación a instituciones educativas

**Descripción:** Las instituciones de origen y receptoras no reciben informes de impacto, debilitando su apoyo al proyecto.

**Causa Raíz:** No hay un proceso establecido para la generación periódica de informes.

## R11

### Post-mortem no se realiza

**Descripción:** Después de incidentes no se hace análisis de causas raíz, los mismos errores se repiten.

**Causa Raíz:** Cultura de "apagar incendios" sin pausa para reflexión.

## R12


### Lenguaje técnico inadecuado para usuarios

**Descripción:** Las comunicaciones usan jerga técnica que ellos no entienden, generando confusión y tickets de soporte.

**Causa Raíz:** Falta de revisión de contenido por un perfil no técnico antes de publicar.



# Matriz de Riesgos (Probabilidad x Impacto)

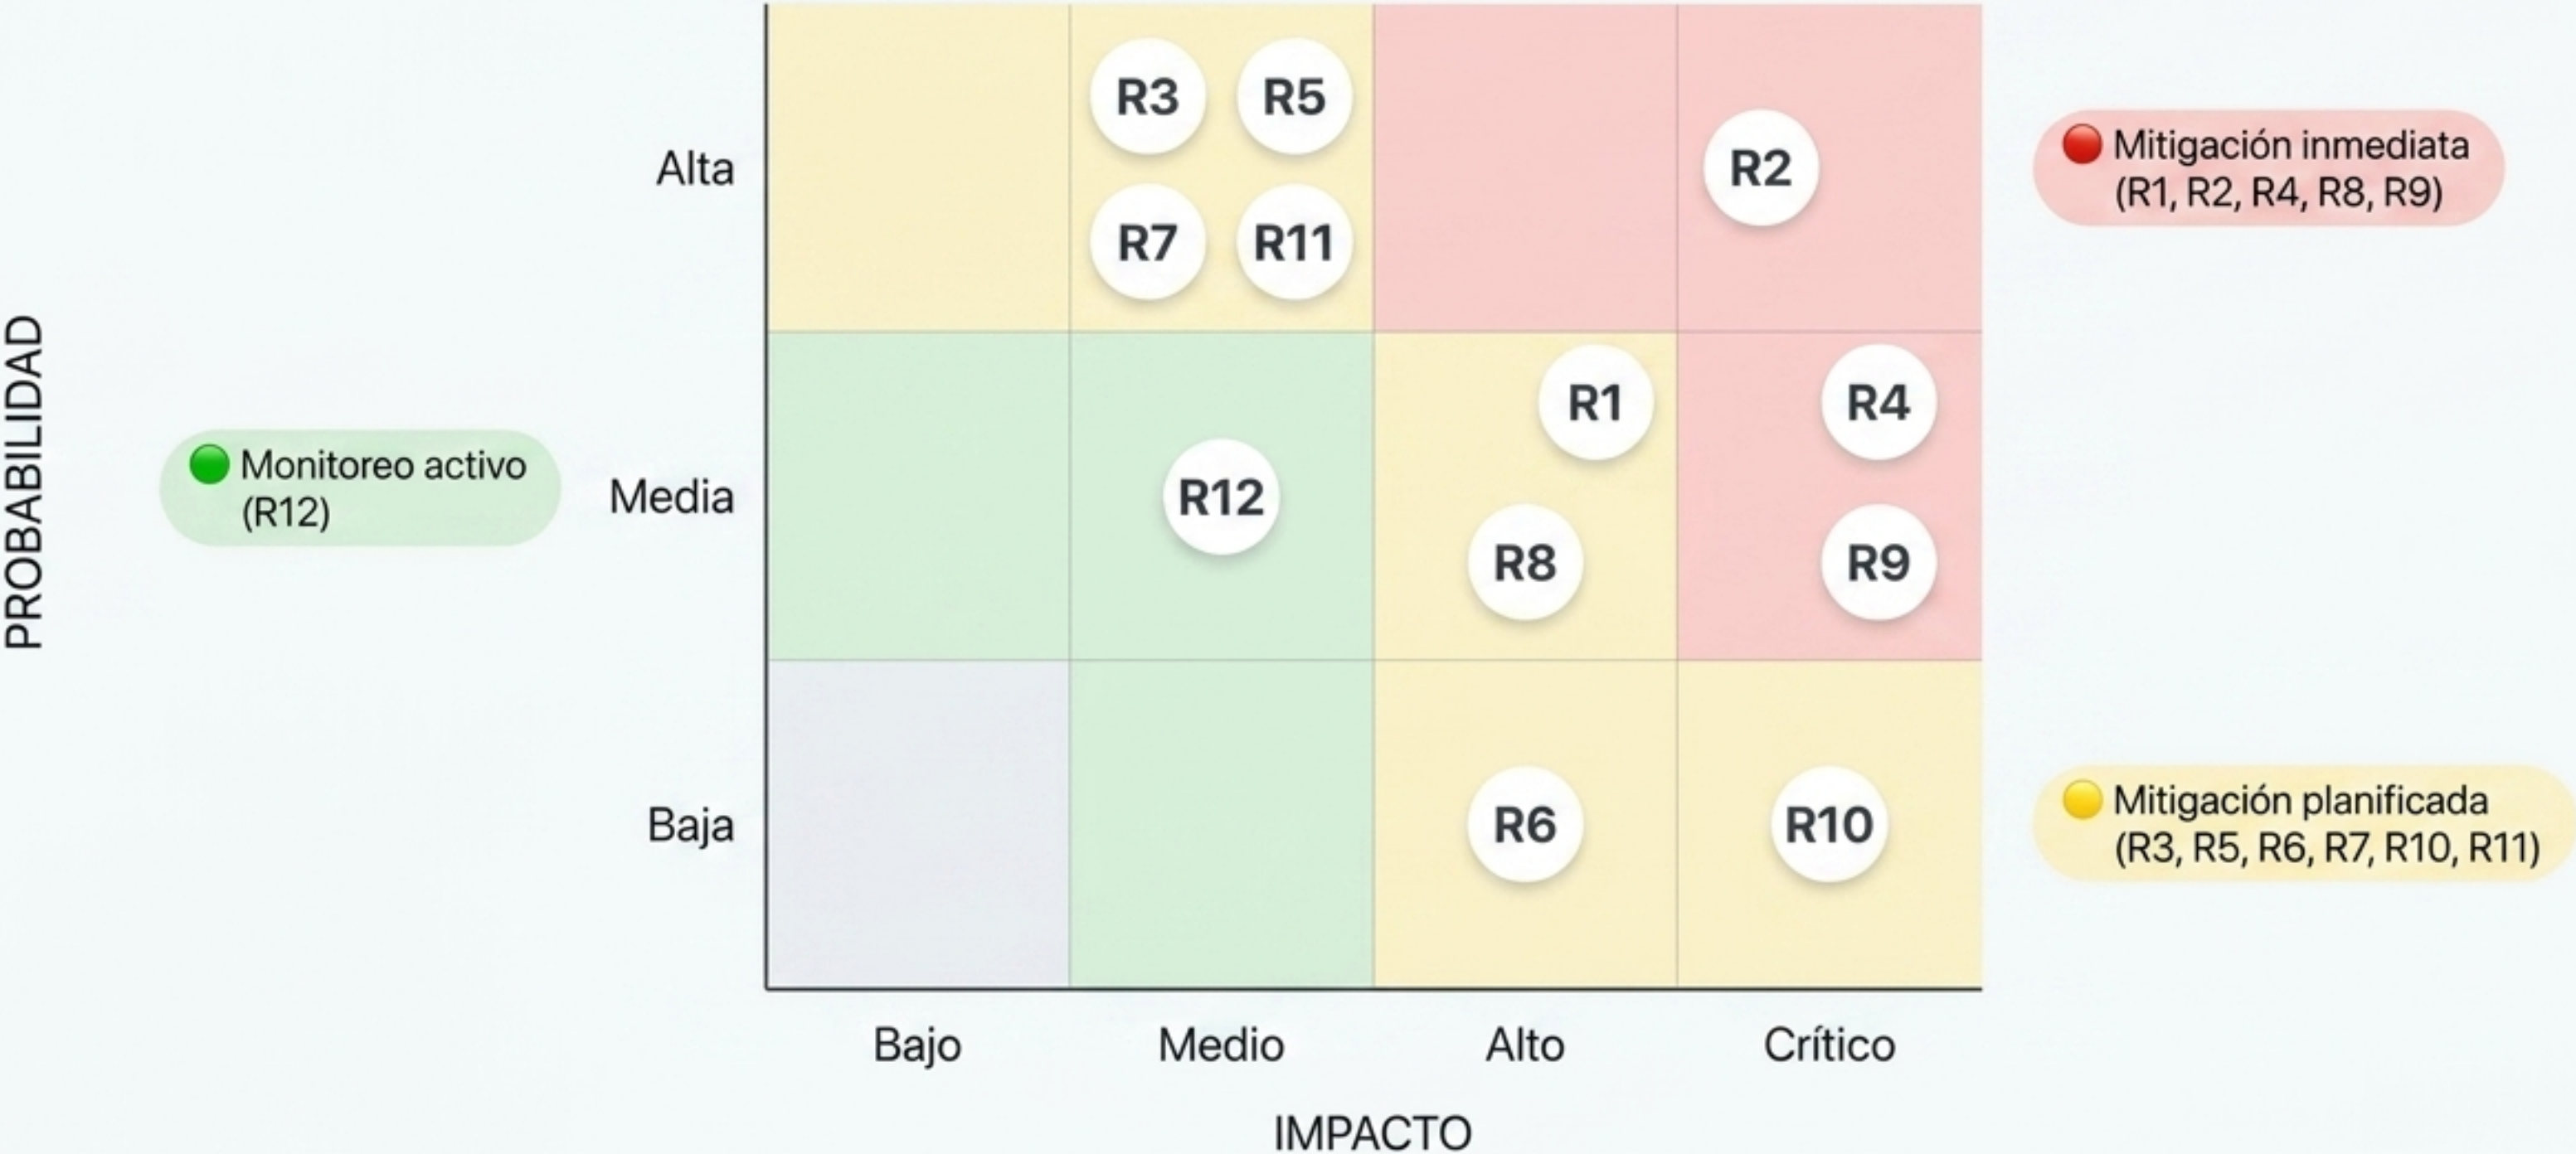




# Matriz de Relación: Riesgo ↔ Stakeholder

|     | Eq. Des. | Admin | Prof. Eval. | Inst. Origen | Inst. Rec. | Coord. | Prov. Cloud | Vol. | Usu. Inv. | Púb. Gen. | Comp. |
|-----|----------|-------|-------------|--------------|------------|--------|-------------|------|-----------|-----------|-------|
| R1  | ●        | ●     |             |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R2  | ●        |       | ●           |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R3  | ●        |       |             |              |            | ●      |             |      |           |           |       |
| R4  |          |       |             |              |            |        |             | ●    | ●         |           |       |
| R5  | ●        |       |             |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R6  |          |       | ●           |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R7  | ●        | ●     |             |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R8  | ●        |       |             |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R9  | ●        | ●     | ●           |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R10 |          |       |             | ●            | ●          |        |             |      |           |           |       |
| R11 | ●        | ●     |             |              |            |        |             |      |           |           |       |
| R12 |          |       |             |              |            |        |             | ●    | ●         |           |       |



# Relación con Riesgos Existentes en Jira

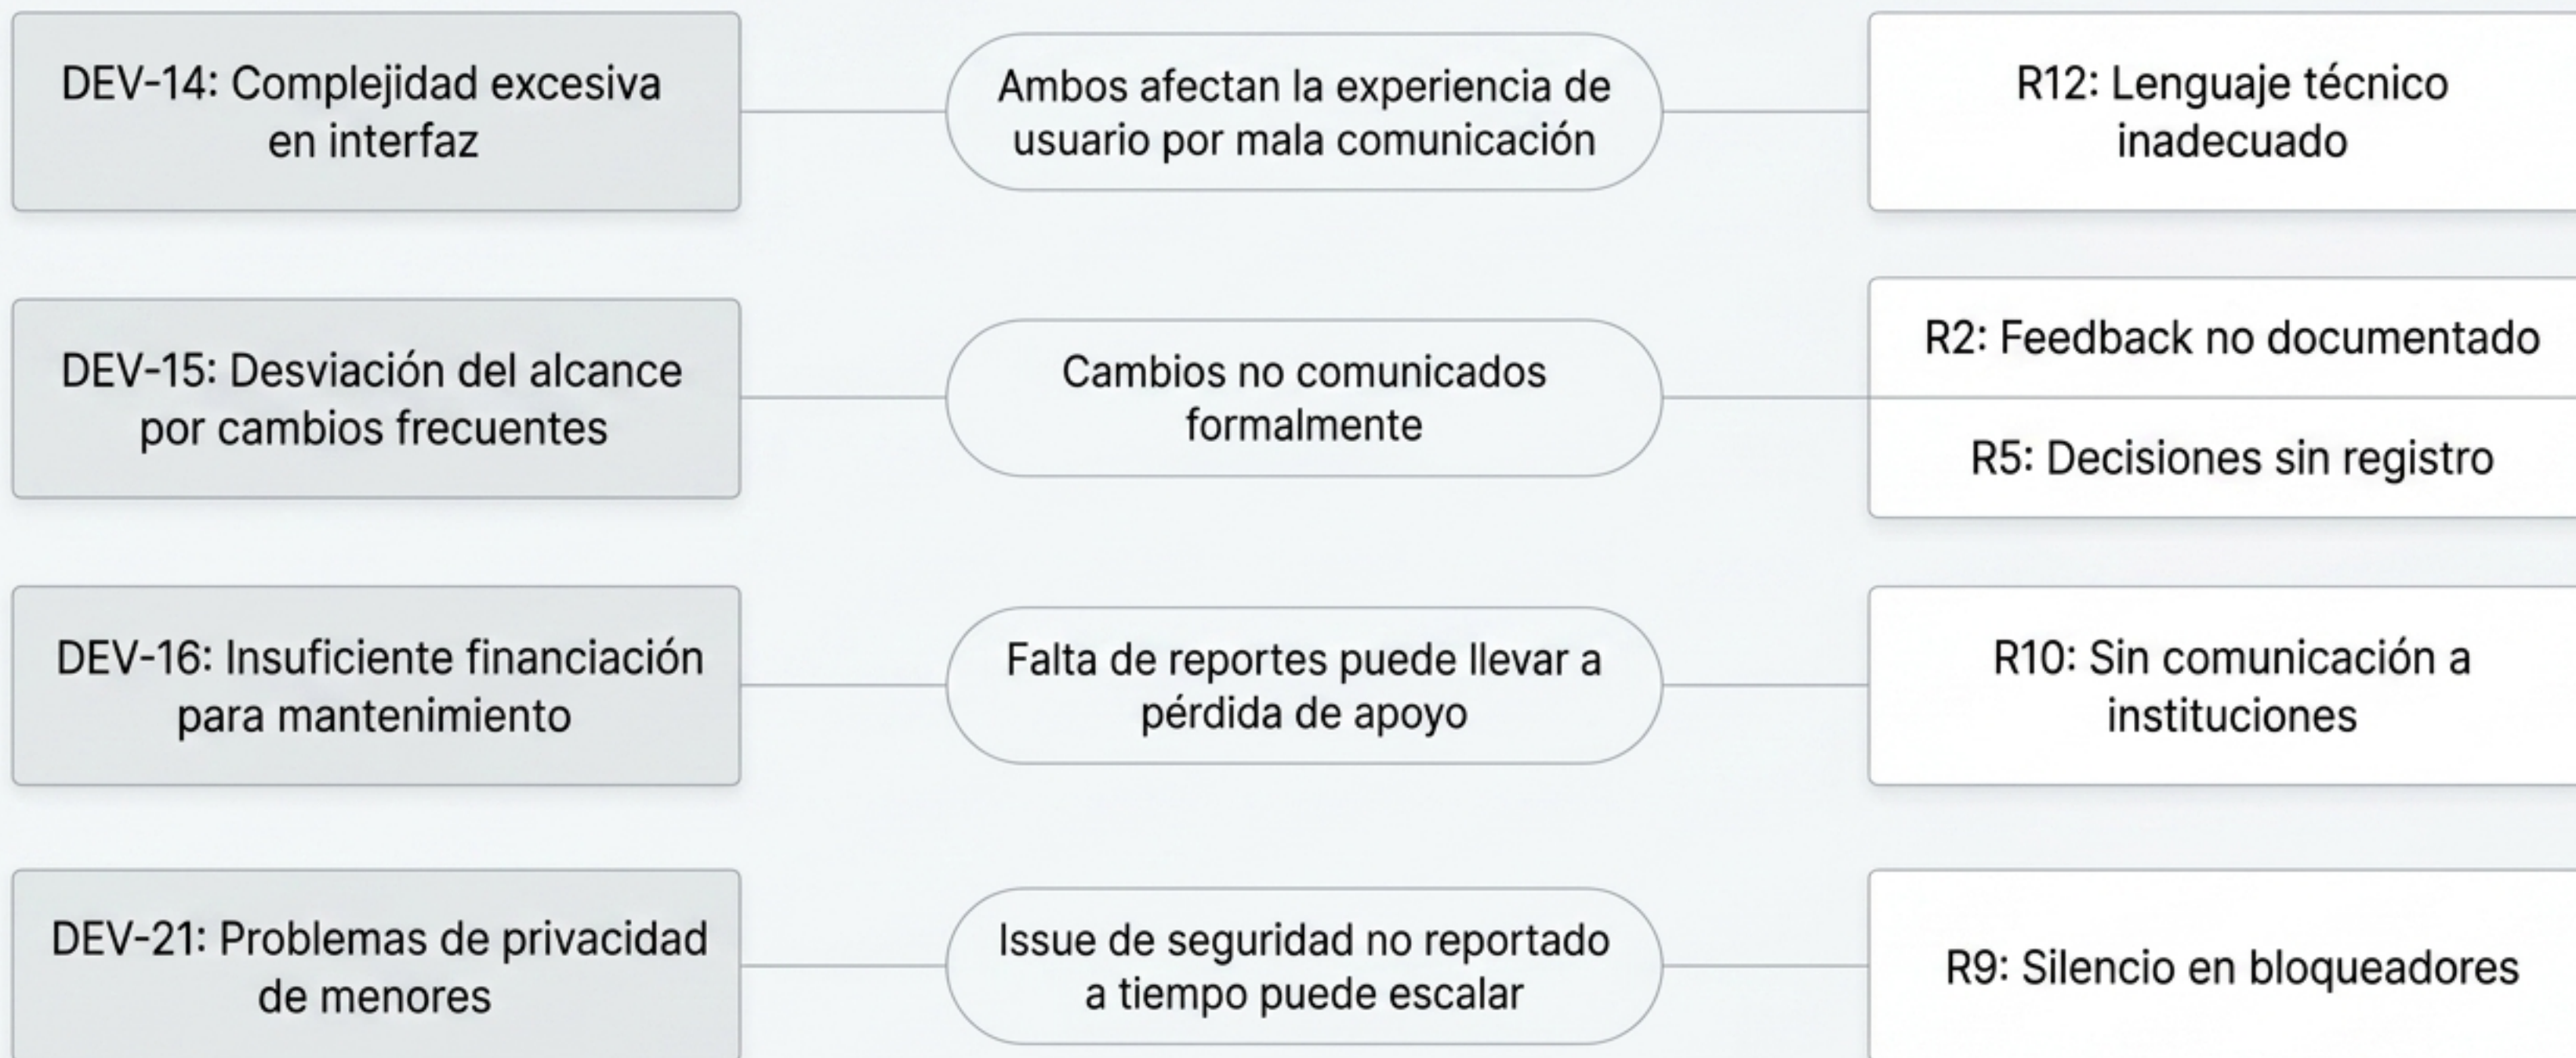



# Plan de Mitigación: 🚫 Zona Crítica (Parte 1)

## Mitigación Inmediata (Implementar antes del próximo sprint)

### R1 - Daily standups no ocurren

**Estrategia: Prevenir** (Establecer ritual obligatorio).

- Fijar horario fijo diario (ej. 9:00 AM, 15 min máx)
- Usar bot en WhatsApp/Discord que recuerde el daily
- Rotar quién lidera cada semana

**Responsable:** Oscar (Lead) |  
**Plazo:** Inmediato

### R2 - Feedback del evaluador no documentado

**Estrategia: Prevenir** (Asignar minutas obligatorias).

- Designar tomador de minutas en cada sprint review
- Usar plantilla de Acta ya diseñada
- Subir a Jira dentro de 24h

**Responsable:** Juan / Veruzka |  
**Plazo:** Cada sprint review

### R4 - Sin notificaciones a usuarios

**Estrategia: Prevenir** (Integrar release communication).

- Agregar checklist en la definición de Done
- Redactar anuncio antes de cada release
- Usar plantilla diseñada

**Responsable:** Veruzka |  
**Plazo:** Por release



## Plan de Mitigación: 🚫 Zona Crítica (Parte 2)

Intervention Card 4

### R8 - Sprint goals ambiguos

**Estrategia:** Prevenir (Mejorar calidad del Sprint Planning).

- Definir un Sprint Goal de una línea al inicio
- Historias con criterios de aceptación antes de entrar
- Validar que los 3 miembros interpreten igual el objetivo

**Responsable:** Oscar (Lead) |

**Plazo:** Cada sprint planning

Intervention Card 5

### R9 - Silencio en bloqueadores

**Estrategia:** Mitigar (Cultura de transparencia).

- Regla: bloqueador >4h sin avance se comparte al chat
- Registrar en Jira con etiqueta "bloqueador"
- El Lead pregunta activamente en cada daily

**Responsable:** Todo el equipo |

**Plazo:** Inmediato



# Plan de Mitigación: ● Zona Alta (Parte 1)

## Mitigación Planificada (Incluir en la gestión del sprint)

### R3 - Jira desactualizado

**Estrategia: Mitigar (Disciplina de tablero).**

- Mover tareas inmediatamente al empezar/terminar
- Al final del día, 5 min para actualizar tablero
- Integración GitHub + Jira para transiciones automáticas

Responsable: Todo el equipo | Plazo: Diario

### R5 - Decisiones sin registro en canales informales

**Estrategia: Mitigar (Volcar decisiones a Jira).**

- Resumir decisiones técnicas de WhatsApp en Jira
- Crear tarea "Decisión: [tema]" si no hay issue relacionado

Responsable: Oscar (Lead) | Plazo: Cada decisión

### R6 - Reportes semanales no enviados

**Estrategia: Prevenir (Automatizar recordatorio).**

- Recordatorio semanal (ej. Calendar, viernes 4 PM)
- Usar plantilla ya diseñada
- Oscar elabora, Juan/Veruzka revisan

Responsable: Oscar (Lead) | Plazo: Cada viernes



# Plan de Mitigación: ● Zona Alta (Parte 2)

## R7 - Documentación técnica desactualizada

**Estrategia: Mitigar** (Documentación como parte del desarrollo).

- Incluir 'documentación actualizada' en la definición de Done
- Mantener README vivo
- Documentar endpoints con Swagger/OpenAPI

**Responsable:** Juan |  
**Plazo:** Por historia

## R10 - Sin comunicación a instituciones

**Estrategia: Prevenir** (Establecer ciclo de reportes).

- Recordatorio trimestral para informe
- Usar plantilla de Informe Trimestral
- Oscar elabora y envía (copia evaluador)

**Responsable:** Oscar (Lead) |  
**Plazo:** Trimestral

## R11 - Post-mortem no se realiza

**Estrategia: Mitigar** (Cultura de mejora continua).

- Tras incidente Nivel 3 o 4, post-mortem en máx 5 días
- Formato: 5 Porqués + plan de acción
- Documentar en Jira como issue 'Riesgo'

**Responsable:** Todo el equipo |  
**Plazo:** Por incidente



# Plan de Mitigación: ● Zona Media

Monitoreo Activo (Revisar periódicamente)

## R12 - Lenguaje técnico inadecuado para usuarios

**Estrategia:** Mitigar (Revisión de contenido).

**Responsable:** Veruzka | **Plazo:** Por cada comunicación a usuarios.

### Acciones Concretas

- ✓ Que un miembro del equipo lea en voz alta la comunicación antes de enviarla.
- ✓ Si hay dudas, simplificar: preguntar "¿lo entendería mi abuela?".
- ✓ Incluir ejemplos concretos en lugar de términos técnicos.



# Indicadores Clave de Riesgo (KRI)

El sistema automatizado de alarmas del proyecto

## KRI-1 (R1)

Días sin daily standup



**Trigger** ⚠️: 2 días consecutivos sin daily.

## KRI-2 (R2)

Sprint review sin acta subida a Jira



**Trigger** ⚠️: 48h después del sprint review.

## KRI-3 (R3)

Tareas en columna "En curso" sin actualizar



**Trigger** ⚠️: 3 días sin movimiento en el tablero.

## KRI-4 (R4)

Release sin comunicación enviada a usuarios



**Trigger** ⚠️: 24h después del despliegue.

## KRI-5 (R9)

Bloqueador reportado sin resolución ni escalamiento



**Trigger** ⚠️: 8h sin actividad en issue bloqueador.

## KRI-6 (R6)

Reporte semanal no enviado



**Trigger** ⚠️: Viernes sin envío (antes del lunes siguiente).



# Resumen Ejecutivo y Veredicto

## El Destilado Numérico

**12** Riesgos Identificados (y mitigados)

5 en Zona Crítica 

6 en Zona Alta 

1 en Zona Media 

**6** Indicadores KRI activados para monitoreo.

**8** Stakeholders impactados.

**4** Riesgos Jira relacionados con comunicación.

## Acciones Prioritarias (Siguiente Sprint)

- ☐ Establecer horario fijo de daily standup (R1)
- ☐ Asignar tomador de minutas para próxima sprint review (R2)
- ☐ Agregar checklist de comunicación a usuarios en Definition of Done (R4)
- ☐ Definir criterios de aceptación en cada historia antes del planning (R8)
- ☐ Comunicar regla de bloqueadores >4h al equipo (R9)
